常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表

2021年8月

污水处理	污水处理量（m^3）	4980928	污泥处理	脱水污泥量（T）	2476.46	水电用量	用电量（度）	1429347	污水电单耗	污水（度/m^3）	0.287
	日均处理量（m^3）	160675		絮凝剂用量（kg）	2675		日均用电量（度）	46108		CODcr（度/kg）	1.59
				含水率（%）	78.2		用水量（T）	2017			
	最高日处理量（m^3）	164480		絮凝剂单耗（kg/T）	4.96	消毒剂	工业合成盐酸（T）	69.64		BOD$_5$（度/kg）	2.92
	最低日处理量（m^3）	155296		产泥率(g/m^3)	108		药单耗(g/m^3)	13.98		SS（度/kg）	2.59
	负荷率（%）	107.1	混凝剂	混凝剂用量（T）	414.48		氯酸钠（T）	17.41	乙酸-厌缺氧段	投加量（吨）	79.70
	进水水温(℃)	31		药单耗(g/m^3)	83.21		药单耗(g/m^3)	3.50		药单耗(g/m^3)	16.00

处理质量	项目	进水（mg/l）	出水（mg/l）	去除率（%）	去除总量（kg）	乙酸-提标段	投加量（吨）	26.94	
							药单耗(g/m^3)	5.41	
	CODcr	188	<16	95.7%	897370	污泥去向	国电(吨)	117.70	79.69
	BOD$_5$	99	<2	99.0%	488870		英科环境(吨)	2358.76	
	SS	116	5	95.7%	552240		其它	0.00	
	TP	3.30	0.14	95.7%	15740	运行情况	应运行天数	31	0.71
	TN	28.7	5.92	79.4%	113501		实际运行天数	31	29.47
	NH_3-N	22.1	0.14	99.4%	109346		达标排放天数	31	0.68
	粪大肠菌群数（个/L）	/	<20	/	/		运转率	100	

备注：本月总用电量为1505594度，其中排水处电量为13340度，除臭工程用电62907度，城北实际用电为1429347度。本月自来水用量为2897吨，其中除臭工程自来水用量为880吨，城北实际用自来水用量为2017吨。
本月产生泥饼2476.46吨，运往英科焚烧中心2358.76吨；运往国电117.7吨。

审核： 制表： 制表日期：2021-9-3

常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表

2021年8月

盐酸单价430 氯酸钠单价 4900 PAM单价28040 消泡剂 12800

日期	水温	天气	日处理水量	污泥量（T）			药剂量	MLSS（mg/l）			电耗	混凝剂	絮凝剂阴离子（kg）	盐酸	氯酸钠	乙酸（T）		回用水（m^3）	实际水量（m^3）	消泡剂	
	度	状况	（m^3）	国电	英科环境	其他	（Kg）	一期	二期	三期	（度）	（T）		（Kg）	（Kg）	厌缺氧	提标段				
1	31	晴	163808	18.36	123.68	0.00	125	3128	3602	3266	46503	2.16	0.00	2288	572	3.16	0.86	0	163808	48	142.04
2	30	晴	159840	16.96	87.22	0.00	100	3352	3252	3148	48903	0.00	0.00	2245	561	3.20	0.87	0	159840	48	104.18
3	30	阴	161120	0.00	71.32	0.00	0	3424	3020	3280	47803	0.00	0.00	2233	558	3.27	0.89	0	161120	48	71.32
4	30	晴	163008	0.00	34.68	0.00	0	3644	3778	3512	48203	0.00	0.00	2216	554	2.42	0.87	0	163008	48	34.68
5	32	晴	160832	0.00	35.26	0.00	0	3542	3100	3230	49003	6.36	0.00	2262	566	2.38	0.86	0	160832	48	35.26
6	31	阴	160320	17.48	0.00	0.00	0	3750	3348	3410	49603	10.08	0.00	2234	559	2.49	0.87	0	160320	48	17.48
7	32	阴	160096	0.00	18.04	0.00	225	3874	3754	3406	51503	13.08	0.00	2268	567	2.52	0.88	0	160096	48	18.04
8	31	晴	158720	16.48	68.20	0.00	150	3664	3854	3442	50803	11.40	0.00	2252	563	2.47	0.86	0	158720	48	84.68
9	32	晴	159168	0.00	107.80	0.00	150	3616	3434	3280	52403	15.36	0.00	2017	504	2.88	0.85	0	159168	48	107.8
10	31	雨	159616	34.10	89.94	0.00	100	3688	3618	3406	51803	15.96	0.00	2064	516	2.53	0.88	0	159616	48	124.04
11	31	阴	155296	0.00	125.44	0.00	50	3700	3554	3600	50603	18.24	0.00	2000	500	2.50	0.88	0	155296	48	125.44
12	31	阴	157056	14.32	17.34	0.00	0	3556	3588	3346	48803	20.76	0.00	2044	511	2.63	0.92	0	157056	48	31.66
13	31	阴	160736	0.00	18.54	0.00	125	3722	3642	3510	49203	23.76	0.00	2016	504	2.29	0.80	0	160736	48	18.54
14	31	雨	159840	0.00	99.48	0.00	150	3950	3654	3712	47703	23.40	0.00	2201	550	2.54	0.89	0	159840	48	99.48
15	30	雨	157248	0.00	137.90	0.00	150	3862	3340	3518	45503	14.40	0.00	2212	553	2.53	0.88	0	157248	48	137.9
16	27	阴	160640	0.00	136.36	0.00	125	3608	3470	3276	46203	11.88	0.00	2244	561	2.46	0.86	0	160640	48	136.36
17	31	晴	163872	0.00	102.42	0.00	125	3314	3516	3408	46603	15.48	0.00	2224	556	2.45	0.85	0	163872	48	102.42
18	31	晴	161856	0.00	103.74	0.00	50	3162	3466	3300	45803	21.60	0.00	2456	614	2.52	0.88	0	161856	48	103.74
19	31	晴	163968	0.00	17.52	0.00	0	2894	3372	3014	46803	8.88	0.00	2462	616	2.52	0.88	0	163968	48	17.52
20	28	阴	164480	0.00	17.88	0.00	0	2784	3480	3218	48503	5.16	0.00	2416	604	2.47	0.86	0	164480	48	17.88
21	31	晴	163968	0.00	17.76	0.00	0	3156	3940	3452	46403	10.68	0.00	2421	605	2.43	0.85	0	163968	48	17.76
22	31	阴	160576	0.00	17.90	0.00	0	2802	4202	3164	49503	16.80	0.00	2455	614	2.52	0.88	0	160576	48	17.9
23	32	阴	159971	0.00	16.66	0.00	125	3380	3978	3522	51703	14.52	0.00	2451	613	2.53	0.88	0	159971	48	16.66
24	30	雨	161661	0.00	104.04	0.00	175	3416	3706	3108	48703	18.96	0.00	2477	619	2.47	0.86	0	161661	48	104.04
25	30	晴	160576	0.00	102.66	0.00	100	3452	3646	3388	45003	21.60	0.00	2461	615	2.60	0.91	0	160576	48	102.66
26	30	阴	156096	0.00	103.34	0.00	100	3502	3504	3420	45803	23.16	0.00	2462	616	2.36	0.82	0	156096	48	103.34
27	30	阴	163680	0.00	116.76	0.00	125	3250	3214	3086	48503	17.28	0.00	2455	614	2.52	0.88	0	163680	48	116.76
28	30	晴	160640	0.00	116.42	0.00	125	3366	3544	3430	50003	17.04	0.00	2412	603	2.49	0.87	0	160640	48	116.42
29	30	晴	161824	0.00	104.22	0.00	100	3522	3462	3378	50603	10.44	0.00	1955	489	2.48	0.86	0	161824	48	104.22
30	31	晴	161888	0.00	140.64	0.00	125	3420	3418	3292	49003	7.44	0.00	1891	473	2.49	0.87	0	161888	48	140.64
31	32	晴	158528	0.00	105.60	0.00	75	3580	3056	3370	48103	18.60	0.00	1844	461	2.58	0.90	0	158528	48	105.6
平均	31	/	160675	3.80	76.09	0.00	86.29	3454	3533	3351	48568	13.37	0.00	2246	562	2.57	0.87	0	160675		
合计	/	/	4980928	117.70	2358.76	0.00	2675	/	/	/	1505594	414.48	0.00	69638	17410	79.70	26.94	0	4980928	1488	

审核： 制表： 制表时间:2021-9-3

	单价	当月用量	合计
电费	0.551	1505593.86	829582.22
絮凝剂	28040.000	2.68	75007.00
盐酸	430.000	69.64	29944.34
氯酸钠	4900.000	17.41	85306.55
混凝剂	348.000	414.48	144239.04
消泡剂	12800.000	1.49	19046.40
污泥外运	22.180	2476.46	54927.88

最大值	164480	脱水污泥量	2476.5
最小值	155296	干污泥量	539.55

106.63575	106.6358
106635.75	106635.8

常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表

2021年8月

日期	进水						一期出水						二、三期出水						总出水						污泥含水率（%）	粪大肠杆菌
	COD_{Cr}	BOD_5	SS	TP	NH_3-N	TN	COD_{Cr}	BOD_5	SS	TP	NH_3-N	TN	COD_{Cr}	BOD_5	SS	TP	NH_3-N	TN	COD_{Cr}	BOD_5	SS	TP	NH_3-N	TN		
	（mg/l）	（mg/l）	（mg/l）	（mg/l）	（mg/l）	（mg/l）	（mg/l）	（mg/l）	（mg/l）	（mg/l）	（mg/l）	（mg/l）	（mg/l）	（mg/l）	（mg/l）	（mg/l）	（mg/l）	（mg/l）	（mg/l）	（mg/l）	（mg/l）	（mg/l）	（mg/l）	（mg/l）		
1	311	158	212	4.42	27.5	45.7	21	<2	5	0.34	0.20	9.75	19	<2	5	0.26	0.13	7.30	<16	<2	5	0.12	0.10	6.75	78.3	
2	154	81	88	3.16	21.2	26.7	18	<2	5	0.24	0.17	8.00	19	<2	5	0.43	0.18	7.60	<16	<2	5	0.13	0.16	7.40	77.9	<20
3	192	105	102	3.14	16.4	22.6	19	<2	5	0.19	0.21	6.25	18	<2	5	0.39	0.21	6.05	<16	<2	5	0.18	0.15	5.95	78.1	<20
4	203	107	140	3.45	25.7	31.4	17	<2	5	0.20	0.16	5.65	18	<2	5	0.20	0.15	5.15	<16	<2	5	0.18	0.14	5.00	77.4	<20
5	177	94	88	3.29	24.7	32.3	19	<2	5	0.28	0.13	8.20	16	<2	5	0.26	0.12	7.50	<16	<2	5	0.17	0.11	7.40	77.8	<20
6	103	53	76	2.14	17.4	23.2	21	<2	5	0.24	0.12	7.00	19	<2	5	0.44	0.13	7.20	<16	<2	5	0.20	0.10	6.68	77.9	50
7	159	84	90	2.79	26.2	35.8	19	<2	5	0.21	0.16	8.00	19	<2	5	0.70	0.17	7.10	<16	<2	5	0.13	0.10	7.05	78.2	
8	252	136	122	3.85	28.8	34.1	19	<2	5	0.18	0.24	8.00	<16	<2	5	0.60	0.23	8.30	<16	<2	5	0.10	0.23	7.60	78.0	
9	218	115	102	4.30	29.4	34.5	18	<2	5	0.27	0.16	7.20	<16	<2	5	0.23	0.12	6.90	<16	<2	5	0.15	0.10	6.58	78.4	360
10	195	103	116	3.53	23.3	29.7	19	<2	5	0.19	0.20	8.20	20	<2	7	0.29	0.23	7.20	<16	<2	5	0.18	0.18	6.95	78.3	<20
11	220	116	146	4.95	25.9	31.4	16	<2	5	0.25	0.17	6.60	17	<2	5	0.60	0.18	6.68	<16	<2	5	0.19	0.10	5.15	78.1	<20
12	323	171	228	3.42	30.4	35.9	16	<2	5	0.17	0.17	7.20	24	<2	8	0.26	0.16	6.18	<16	<2	5	0.15	0.13	5.40	78.6	<20
13	243	126	166	3.12	16.8	23.2	16	<2	5	0.31	0.21	6.25	<16	<2	5	0.55	0.20	5.85	<16	<2	5	0.13	0.19	5.65	78.0	<20
14	113	58	84	2.39	10.4	17.3	18	<2	6	0.28	0.14	4.95	17	<2	7	0.67	0.15	5.40	<16	<2	5	0.15	0.11	4.19	77.6	
15	167	88	100	4.02	43.5	48.9	<16	<2	5	0.32	0.40	7.60	17	<2	6	0.76	0.46	6.75	<16	<2	5	0.13	0.25	4.80	77.9	
16	96	50	62	2.81	8.86	14.2	18	<2	5	0.27	0.12	4.72	<16	<2	5	0.30	0.11	4.62	<16	<2	5	0.09	0.10	4.52	78.3	<20
17	169	90	102	5.69	17.7	26.4	18	<2	5	0.40	0.26	5.57	16	<2	5	0.67	0.12	4.52	<16	<2	5	0.12	0.11	4.22	78.6	<20
18	155	82	78	3.79	16.2	23.4	<16	<2	5	0.35	0.14	6.67	<16	<2	5	0.74	0.12	5.44	<16	<2	5	0.18	0.10	4.67	77.9	<20
19	179	95	64	3.49	20.3	25.9	20	<2	7	0.32	0.22	7.61	<16	<2	5	0.55	0.10	6.37	<16	<2	5	0.13	0.10	6.32	78.1	<20
20	188	100	92	2.71	19.4	24.7	16	<2	5	0.21	0.14	8.06	<16	<2	5	0.25	0.16	7.71	<16	<2	5	0.10	0.10	6.27	78.4	<20
21	198	102	102	3.02	21.0	26.7	21	<2	7	0.31	0.15	7.18	20	<2	8	0.52	0.36	5.97	<16	<2	5	0.13	0.13	5.67	78.9	
22	190	100	122	2.34	23.2	28.9	22	<2	7	0.37	0.42	8.46	23	<2	5	0.81	0.95	9.51	<16	<2	5	0.13	0.38	7.86	79.2	
23	213	113	142	3.04	29.2	36.9	19	<2	6	0.40	0.26	6.80	<16	<2	5	0.82	0.18	6.67	<16	<2	5	0.14	0.10	6.52	78.8	<20
24	170	92	146	3.25	20.0	25.9	16	<2	5	0.27	0.11	8.01	<16	<2	5	0.77	0.22	7.41	<16	<2	5	0.12	0.10	5.87	78.1	<20
25	246	132	164	4.03	23.4	29.0	19	<2	6	0.37	0.29	6.77	<16	<2	5	0.82	0.22	6.57	<16	<2	5	0.20	0.16	6.42	78.4	230
26	129	69	78	2.33	10.1	15.4	19	<2	5	0.90	0.12	4.52	16	<2	5	0.77	0.10	4.12	<16	<2	5	0.19	0.10	3.72	77.8	<20
27	134	70	76	2.82	17.1	23.6	16	<2	5	0.33	0.11	5.44	<16	<2	5	0.48	0.12	5.02	<16	<2	5	0.21	0.10	4.02	78.2	50
28	182	95	114	2.56	18.2	24.9	<16	<2	5	0.20	0.13	6.27	<16	<2	5	0.37	0.24	4.82	<16	<2	5	0.12	0.11	4.62	77.9	
29	212	110	146	3.55	31.0	36.7	19	<2	5	0.28	0.29	8.84	<16	<2	5	0.29	0.27	7.81	<16	<2	5	0.12	0.13	7.71	78.6	
30	171	91	126	1.71	19.7	27.8	17	<2	5	0.28	0.52	7.71	<16	<2	5	0.23	0.49	7.66	<16	<2	5	0.11	0.15	6.92	78.1	<20
31	171	90	118	3.29	21.8	26.7	<16	<2	5	0.24	0.16	7.71	16	<2	5	0.56	0.17	6.67	<16	<2	5	0.06	0.10	5.52	78.8	<20
平均	188	99	116	3.30	22.1	28.7	18	<2	5	0.30	0.20	7.07	18	<2	5	0.50	0.22	6.52	<16	<2	5	0.14	0.14	5.92	78.2	<20

审核：　　　　　　　　　　制表：　　　　　　　　　　制表日期：2021-9-3

96	49.9	62	1.71	8.9	14.2	16.0	0.00	5.00	0.17	0.11	4.52	16	0	5	0.2	0.1	4.12	0	0	5	0.06	0.10	3.72	77.4	
323	171	228	5.69	43.5	48.9	22	0.00	7.00	0.9	0.52	9.75	24	0.00	8	0.82	0.95	9.51	0	0	5	0.21	0.38	7.86	79.2	
进水						一期出水						二、三期出水						总出水						污泥含水率	大肠杆菌
CODCr	BOD5	SS	TP	NH3-N	TN	CODCr	BOD5	SS	TP	NH3-N	TN	CODCr	BOD5	SS	TP	NH3-N	TN	CODCr	BOD5	SS	TP	NH3-N	TN		
(mg/1)	(mg/1)	(mg/1)	(mg/1)	(mg/1)	(mg/1)	(mg/1)	(mg/1)	(mg/1)	(mg/1)	(mg/1)	(mg/1)	(mg/1)	(mg/1)	(mg/1)	(mg/1)	(mg/1)	(mg/1)	(mg/1)	(mg/1)	(mg/1)	(mg/1)	(mg/1)	(mg/1)		

地表水一类标准达标天数					
≤15	≤3	/	≤0.02	≤0.15	≤0.2
0	0		0	24	
地表水二类标准达标天数					
≤15	≤3	/	≤0.1	≤0.5	≤0.5
0	#REF!		4	7	
地表水三类标准达标天数					
≤20	≤4	/	≤0.2	≤1	≤1
0	#REF!		26	0	
地表水四类标准达标天数					
≤30	≤6	/	≤0.3	≤1.5	≤1.5
0	0		1	0	
地表水五类标准达标天数					
≤40	≤10	/	≤0.4	≤2	≤2
0	0		0	0	
超过地表水五类标准达标天数					
#REF!	0	/	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

COD进出水数据比对

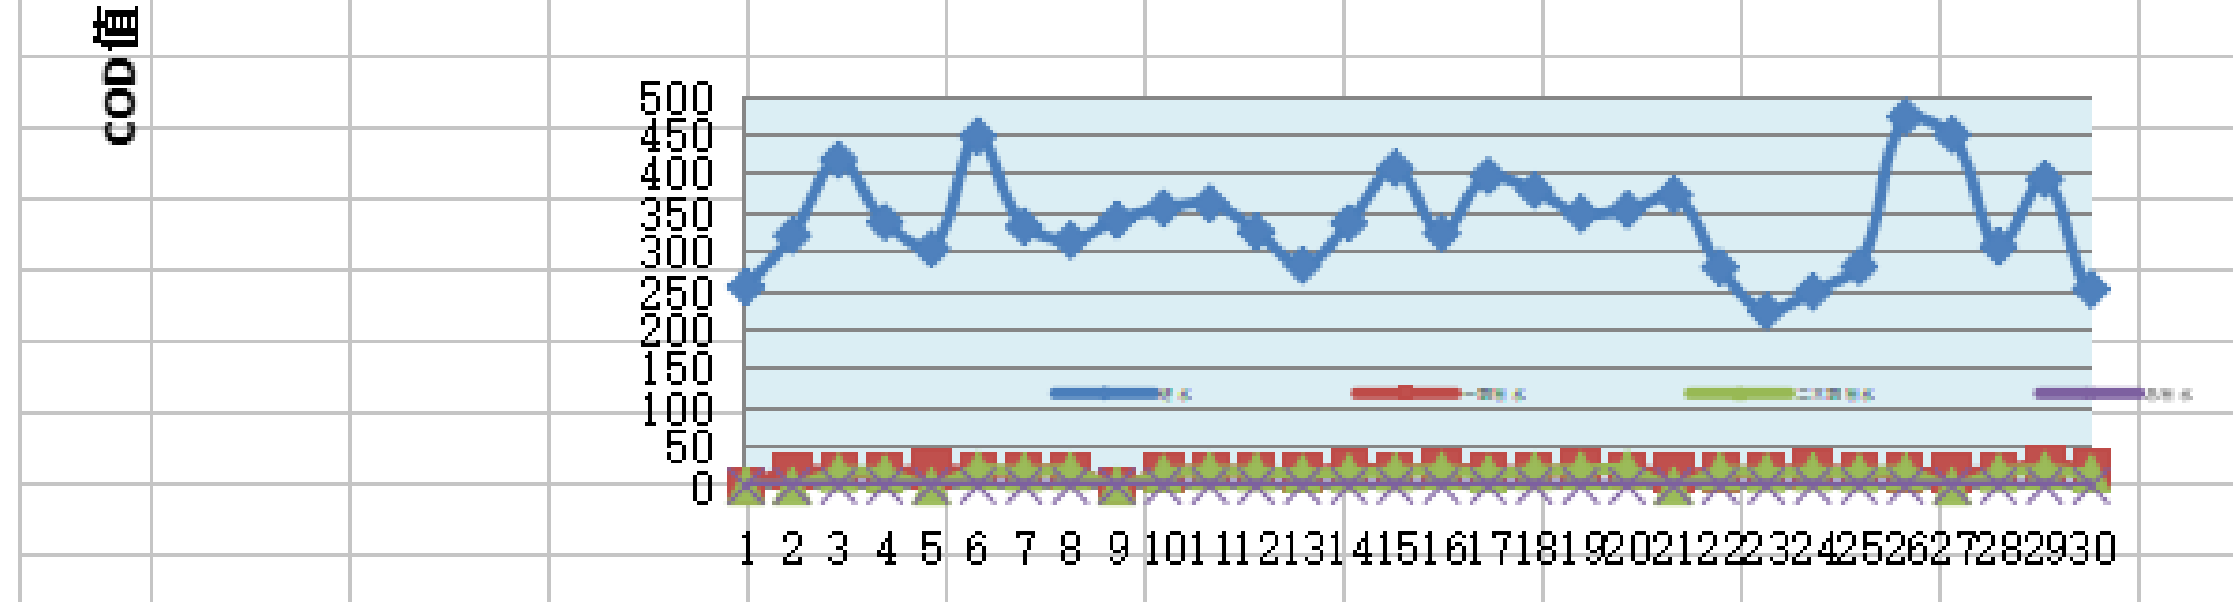

BOD5进出水数据比对

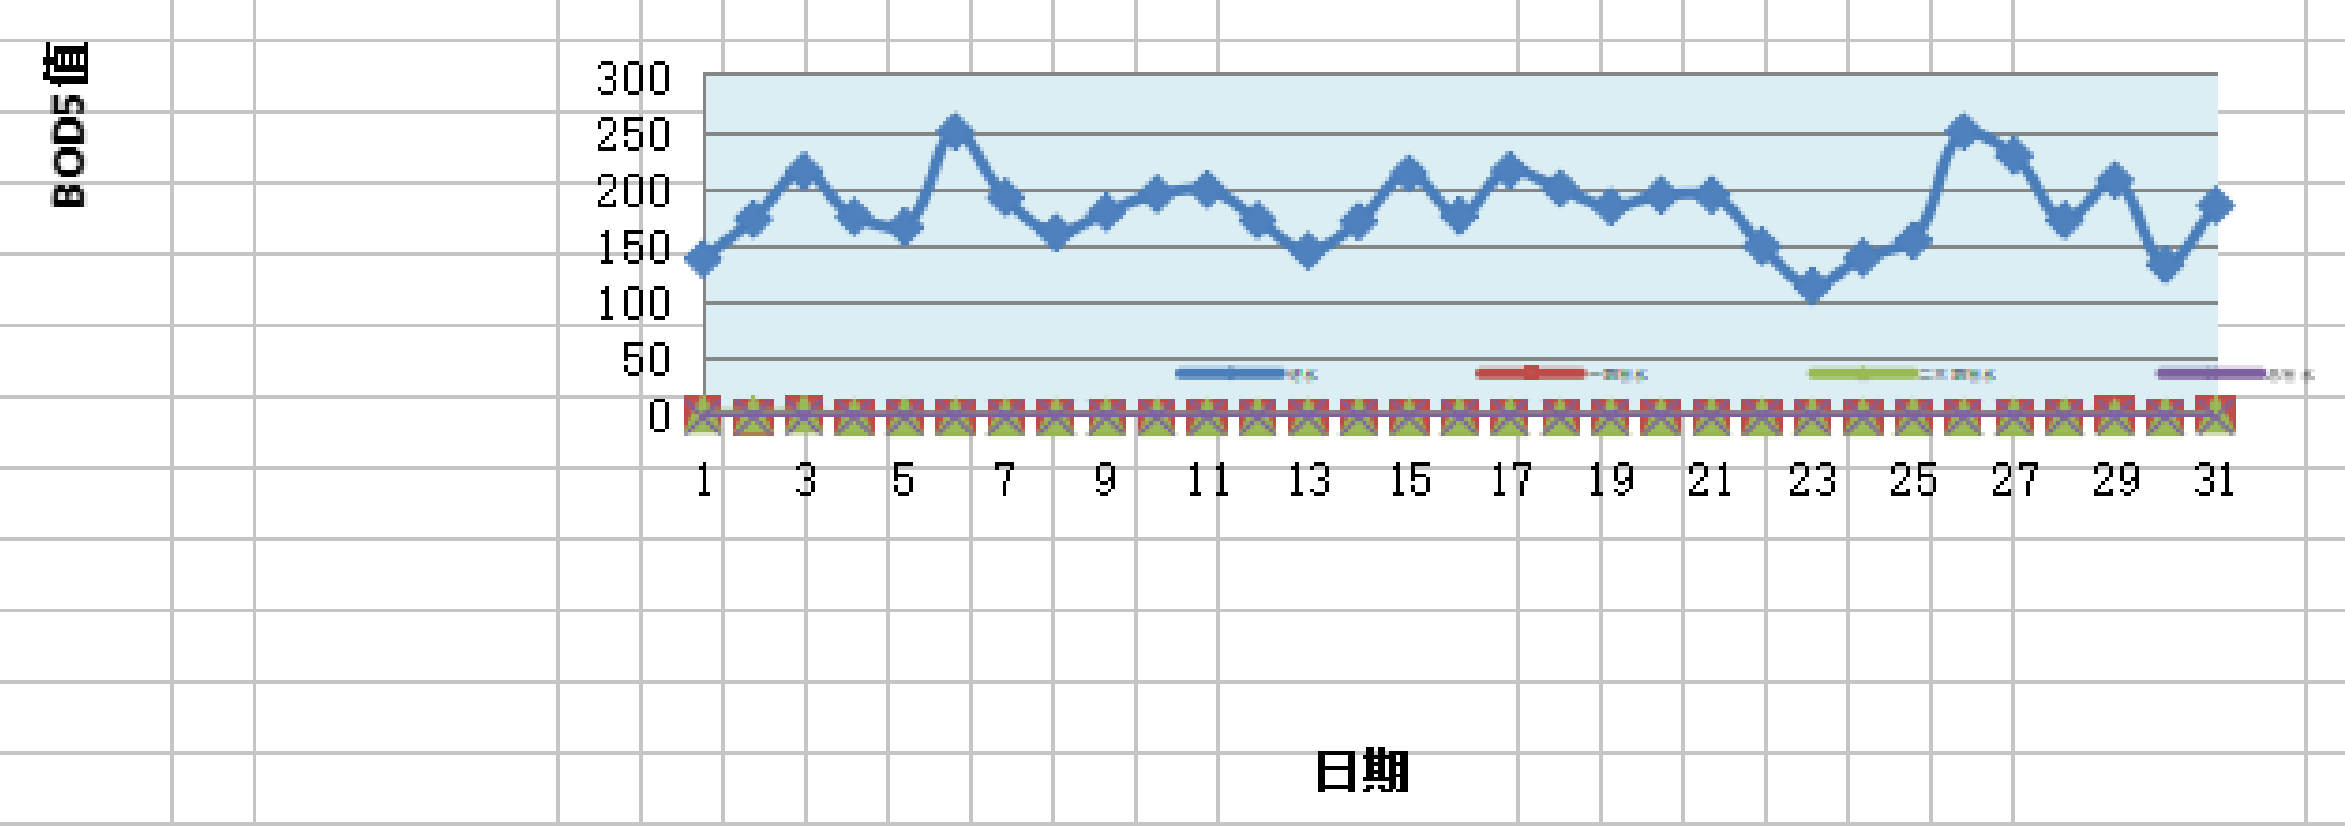

SS进出水数据比对

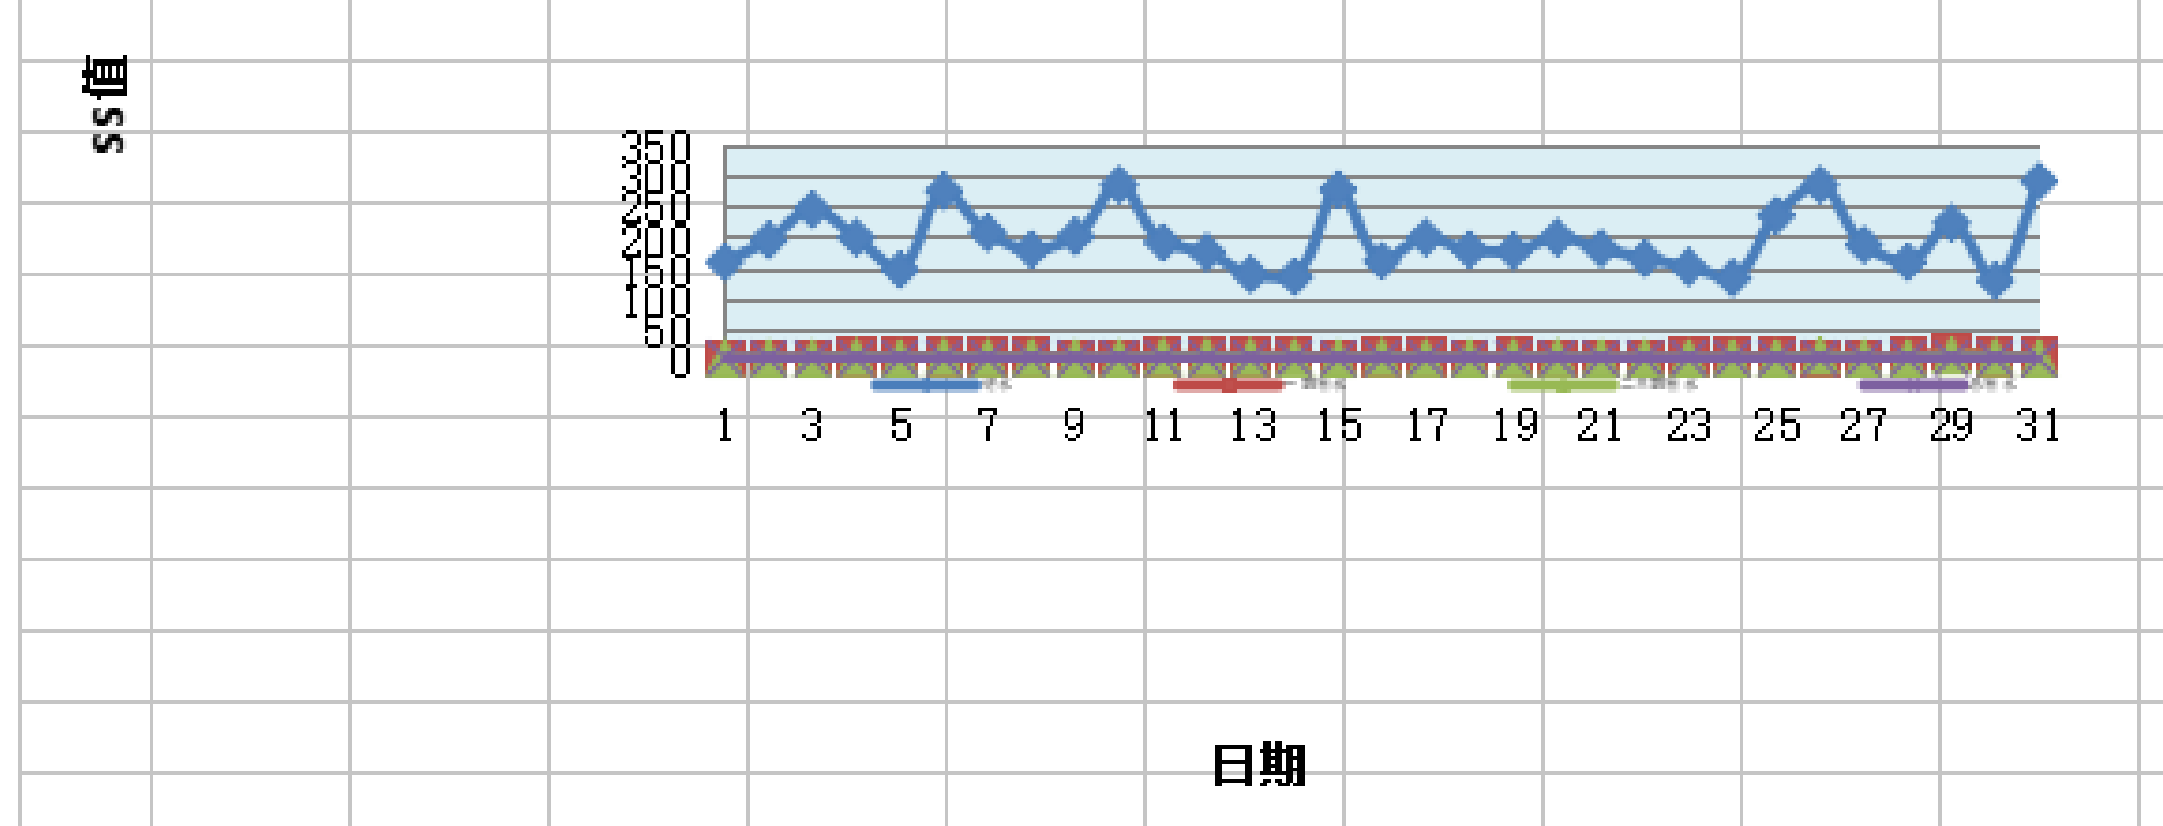

TP进出水数据比对

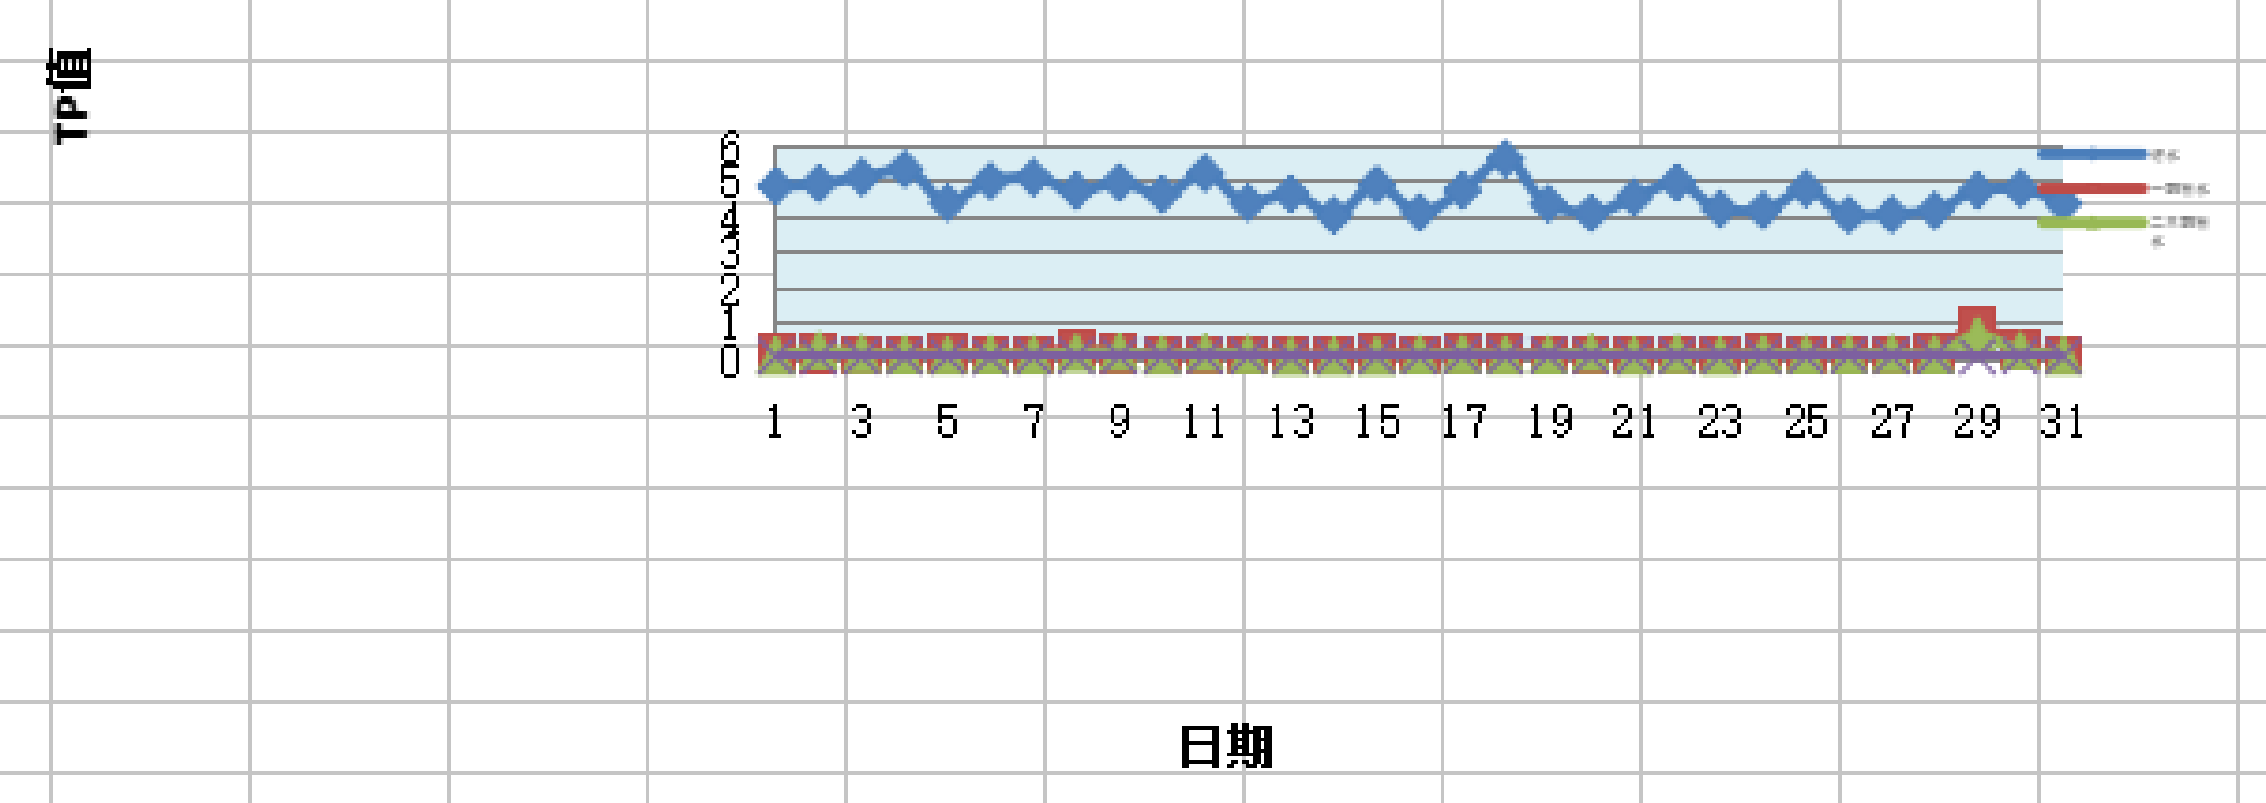

NH3-N进出水数据比对

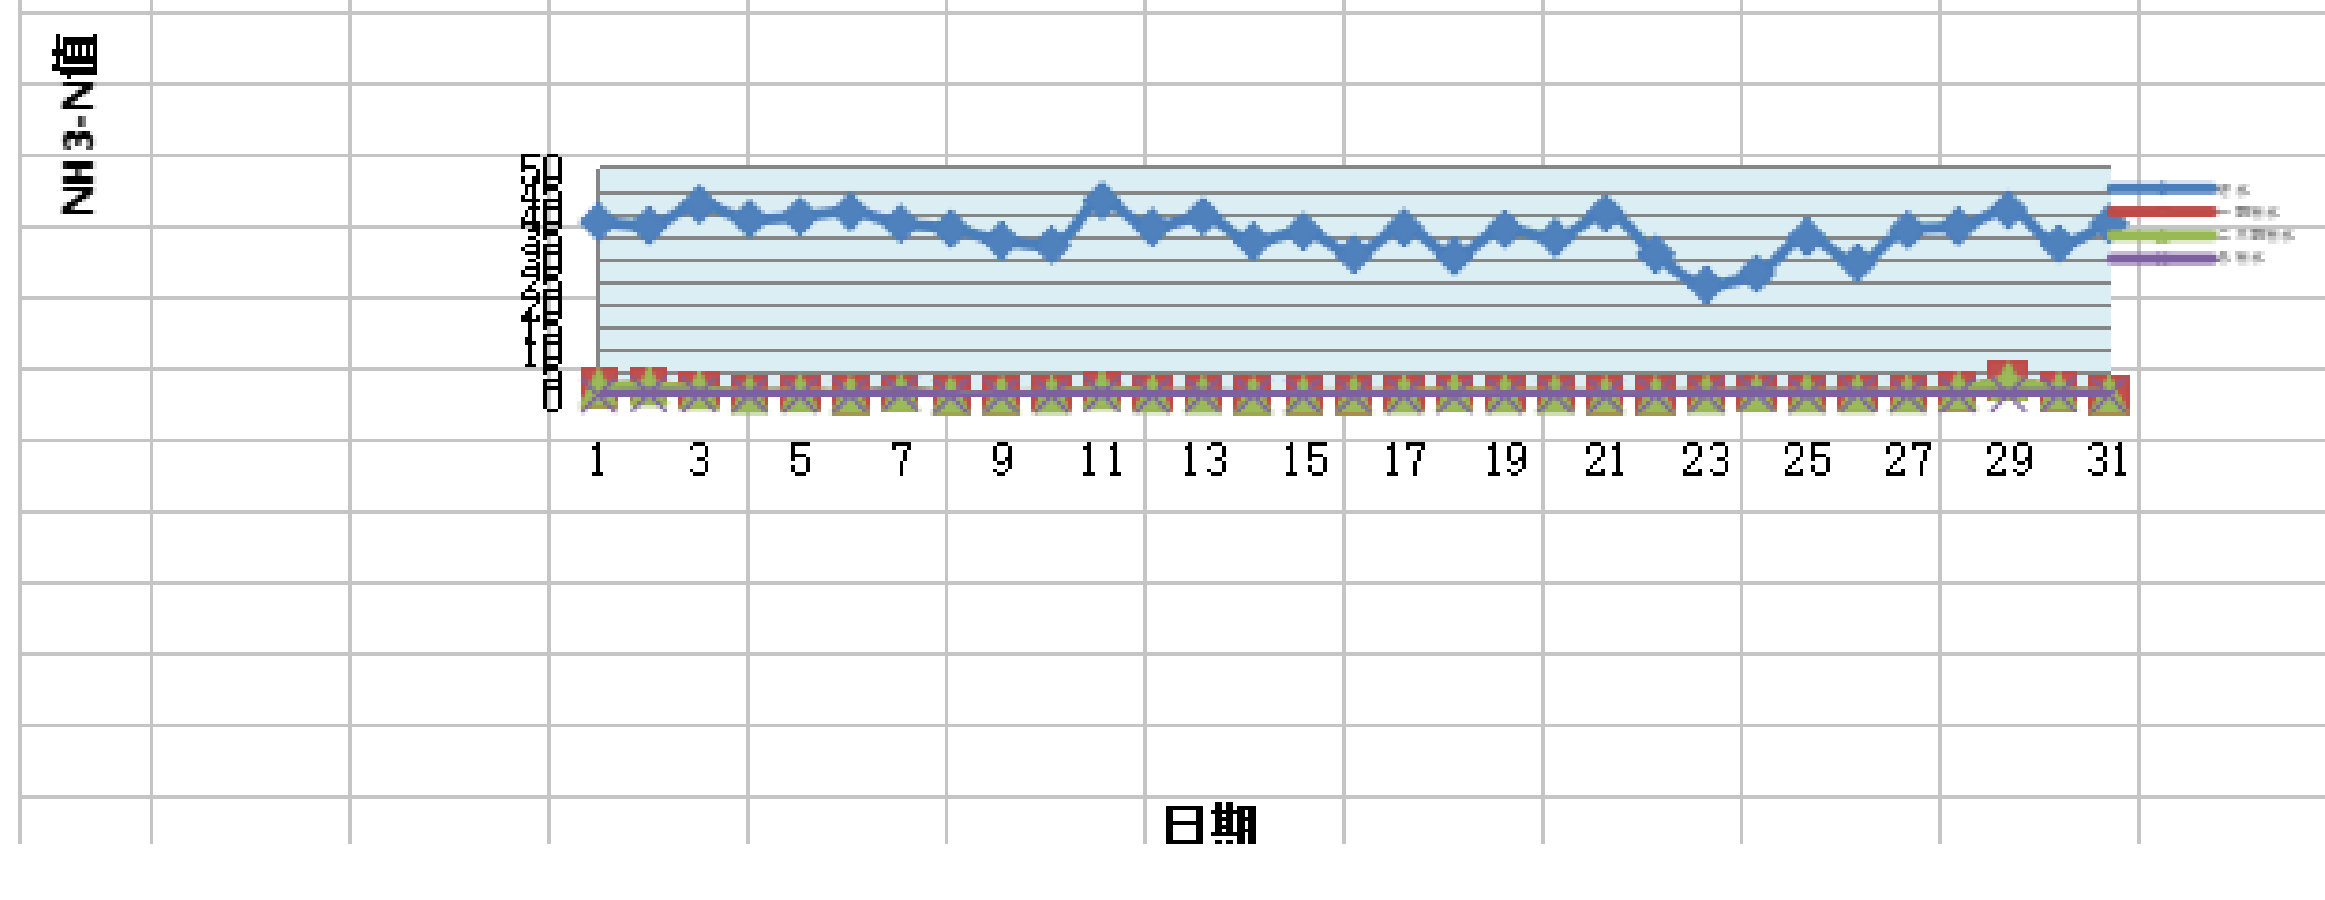

TN进出水数据比对

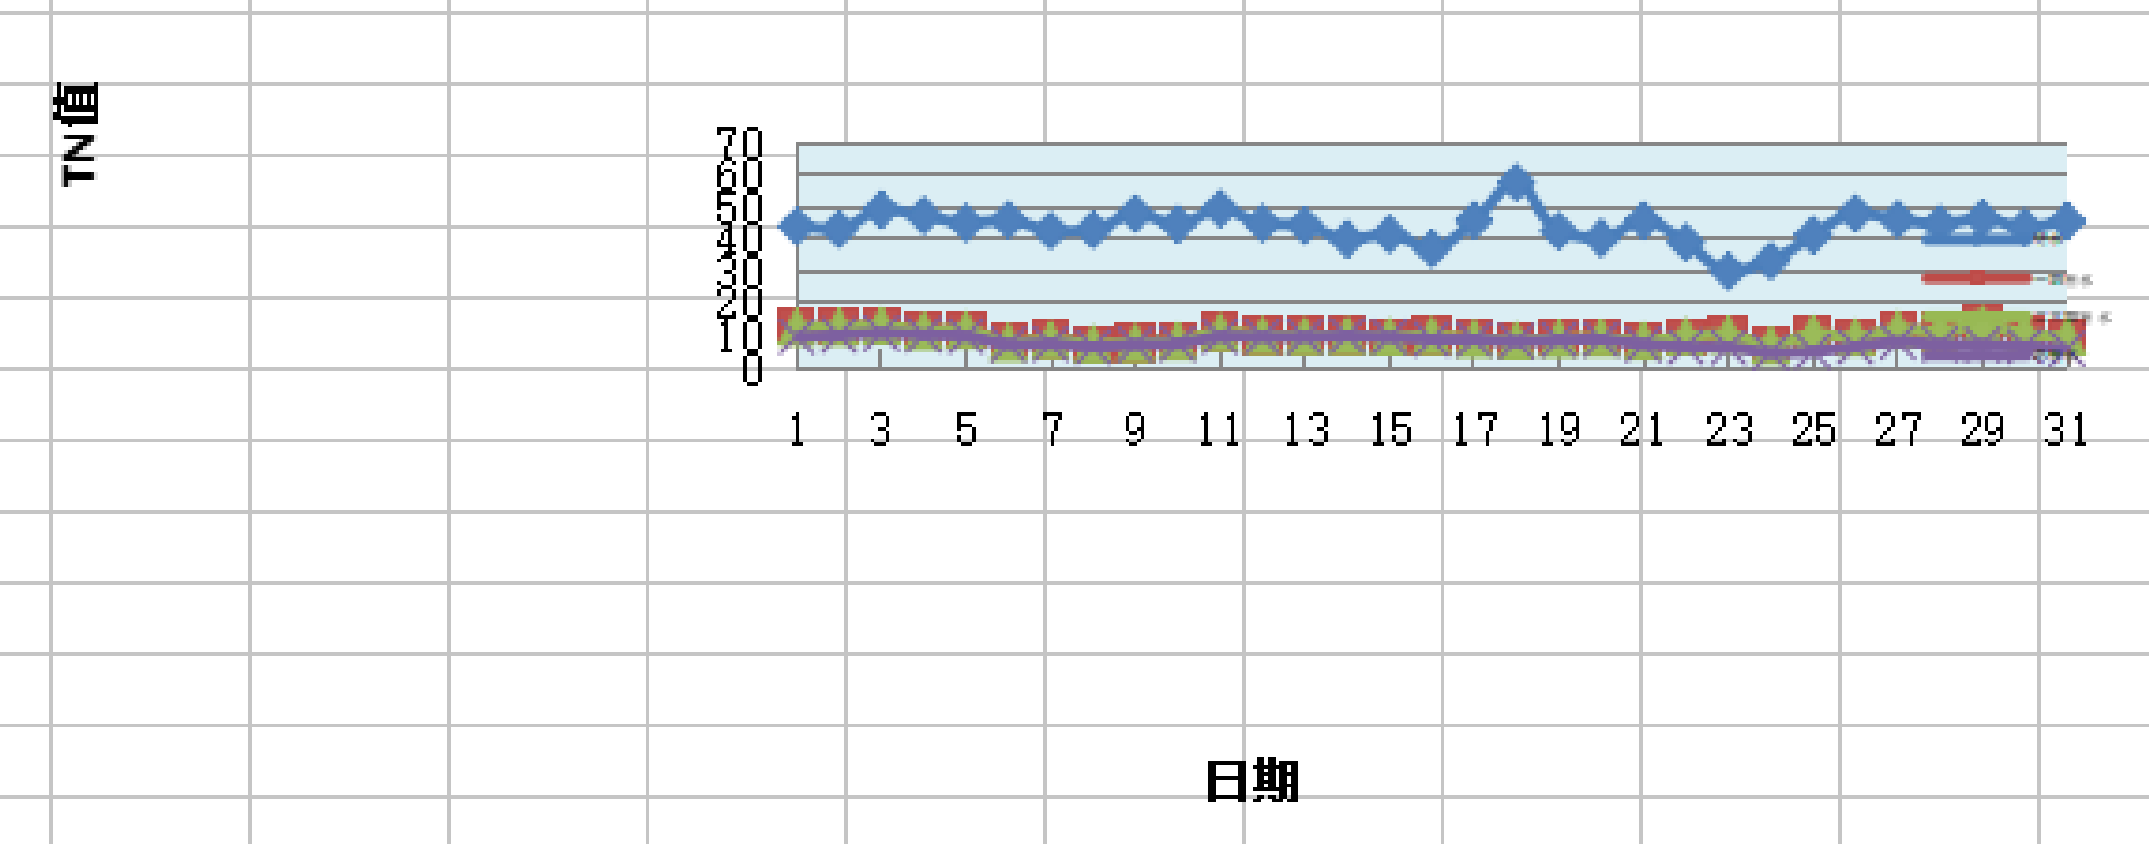

常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一）
2021年8月

编号	设备名称	运行天数（d）	定时（h/d）	额定运行时间（h）	实际运行时间（h）	故障（h）	利用率（%）	完好率（%）	检修保养情况	备 注
一期										
1	刮泥机1#	31	24	744	0		0.0%	100		
2	污水二次提升泵1#	31	24	744	0		0.0%	100		
3	污水二次提升泵2#	31	24	744	744		100.0%	100		
4	污水二次提升泵3#	31	24	744	744		100.0%	100		
5	污水二次提升泵4#	31	24	744	744		100.0%	100		
6	污水二次提升泵5#	31	24	744	744		100.0%	100		
7	污水二次提升泵6#	31	24	744	0		0.0%	100		
8	水下搅拌器1#	31	24	744	744		100.0%	100		
9	水下搅拌器2#	31	24	744	744		100.0%	100		
10	水下搅拌器3#	31	24	744	744		100.0%	100		
11	水下搅拌器4#	31	24	744	744		100.0%	100		
12	水下搅拌器5#	31	24	744	744		100.0%	100		
13	水下搅拌器6#	31	24	744	744		100.0%	100		
14	水下搅拌器7#	31	24	744	744		100.0%	100		
15	水下搅拌器8#	31	24	744	744		100.0%	100		
16	水下搅拌器9#	31	24	744	744		100.0%	100		
17	水下搅拌器10#	31	24	744	744		100.0%	100		
18	水下搅拌器11#	31	24	744	744		100.0%	100		
19	水下搅拌器12#	31	24	744	744		100.0%	100		
20	水下搅拌器13#	31	24	744	744		100.0%	100		
21	水下搅拌器14#	31	24	744	744		100.0%	100		
22	水下搅拌器15#	31	24	744	744		100.0%	100		
23	水下搅拌器16#	31	24	744	744		100.0%	100		
24	水下搅拌器17#	31	24	744	744		100.0%	100		
25	水下搅拌器18#	31	24	744	744		100.0%	100		
26	内回流泵1#	31	24	744	744		100.0%	100		
27	内回流泵2#	31	24	744	744		100.0%	100		

审核： 制表： 制表时间：2021-9-3

常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二）
2021年8月

编号	设备名称	运行天数（d）	定时（h/d）	额定运行时间（h）	实际运行时间（h）	故障（h）	利用率（%）	完好率（%）	检修保养情况	备 注
28	内回流泵3#	31	24	744	744		100.0%	100		
29	内回流泵4#	31	24	744	294.5		39.6%	100		
30	内回流泵5#	31	24	744	744		100.0%	100		
31	内回流泵6#	31	24	744	744		100.0%	100		
32	内回流泵7#	31	24	744	742	2	99.7%	99.7	8月9日过热故障检修	
33	内回流泵8#	31	24	744	295		39.7%	100		
34	回流泵1#	31	24	744	744		100.0%	100		
35	回流泵2#	31	24	744	744		100.0%	100		
36	回流泵3#	31	24	744	0		0.0%	100		
37	回流泵4#	31	24	744	744		100.0%	100		
38	回流泵5#	31	24	744	744		100.0%	100		
39	回流泵6#	31	24	744	0		0.0%	100		
40	吸泥机1#	31	24	744	744		100.0%	100		
41	吸泥机2#	31	24	744	744		100.0%	100		
42	吸泥机3#	31	24	744	744		100.0%	100		
43	吸泥机4#	31	24	744	744		100.0%	100		
44	浓缩机1#	31	24	744	0		0.0%	100		
45	浓缩机2#	31	24	744	744		100.0%	100		
46	浓缩机3#	31	24	744	744		100.0%	100		
一期缺好氧池										
47	水下搅拌器1#	31	24	744	744		100.0%	100		
48	水下搅拌器2#	31	24	744	744		100.0%	100		
49	水下搅拌器3#	31	24	744	744		100.0%	100		
50	水下搅拌器4#	31	24	744	744		100.0%	100		
51	水下搅拌器5#	31	24	744	744		100.0%	100		
52	水下搅拌器6#	31	24	744	744		100.0%	100		
53	水下搅拌器7#	31	24	744	744		100.0%	100		
54	水下搅拌器8#	31	24	744	744		100.0%	100		

审核： 制表： 制表时间：2021-9-3

常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三）
2021年8月

编号	设备名称	运行天数（d）	定时（h/d）	额定运行时间（h）	实际运行时间（h）	故障（h）	利用率（%）	完好率（%）	检修保养情况	备 注
55	水下搅拌器9#	31	24	744	744		100.0%	100		
56	水下搅拌器10#	31	24	744	744		100.0%	100		
57	水下搅拌器11#	31	24	744	744		100.0%	100		
58	水下搅拌器12#	31	24	744	744		100.0%	100		
二期										
59	水下推流器7#	31	24	744	0		0.0%	100		
60	水下推流器8#	31	24	744	0		0.0%	100		
61	水下推流器9#	31	24	744	0		0.0%	100		
62	水下推流器10#	31	24	744	744		100.0%	100		
63	水下推流器11#	31	24	744	0		0.0%	100		
64	水下推流器12#	31	24	744	0		0.0%	100		
65	厌缺氧池提升泵1#	31	24	744	0		0.0%	100		
66	厌缺氧池提升泵2#	31	24	744	0		0.0%	100		
67	厌缺氧池提升泵3#	31	24	744	0		0.0%	100		
68	水下搅拌器1#	31	24	744	744		100.0%	100		
69	水下搅拌器2#	31	24	744	719.5		96.7%	100		
70	水下搅拌器3#	31	24	744	744		100.0%	100		
71	水下搅拌器4#	31	24	744	744		100.0%	100		
72	水下搅拌器5#	31	24	744	744		100.0%	100		
73	水下搅拌器6#	31	24	744	744		100.0%	100		
74	水下搅拌器7#	31	24	744	744		100.0%	100		
75	水下搅拌器8#	31	24	744	744		100.0%	100		
76	水下搅拌器9#	31	24	744	744		100.0%	100		
77	水下搅拌器10#	31	24	744	744		100.0%	100		
78	水下搅拌器11#	31	24	744	744		100.0%	100		
79	水下搅拌器12#	31	24	744	744		100.0%	100		
80	水下搅拌器13#	31	24	744	0		0.0%	100		
81	水下搅拌器14#	31	24	744	0		0.0%	100		

审核： 制表： 制表时间：2021-9-3

常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四）
2021年8月

编号	设备名称	运行天数（d）	定时（h/d）	额定运行时间（h）	实际运行时间（h）	故障（h）	利用率（%）	完好率（%）	检修保养情况	备 注
82	水下搅拌器15#	31	24	744	744		100.0%	100		
83	水下搅拌器16#	31	24	744	744		100.0%	100		
84	水下搅拌器17#	31	24	744	744		100.0%	100		
85	水下搅拌器18#	31	24	744	744		100.0%	100		
86	水下搅拌器19#	31	24	744	744		100.0%	100		
87	水下搅拌器20#	31	24	744	384		51.6%	100		
88	水下搅拌器21#	31	24	744	744		100.0%	100		
89	水下搅拌器22#	31	24	744	744		100.0%	100		
90	水下搅拌器23#	31	24	744	744		100.0%	100		
91	水下搅拌器24#	31	24	744	744		100.0%	100		
92	水下搅拌器25#	31	24	744	744		100.0%	100		
93	水下搅拌器26#	31	24	744	0		0.0%	100		
94	水下搅拌器27#	31	24	744	744		100.0%	100		
95	水下搅拌器28#	31	24	744	744		100.0%	100		
96	水下搅拌器29#	31	24	744	0		0.0%	100		
97	水下搅拌器30#	31	24	744	744		100.0%	100		
98	回流泵7#	31	24	744	536	2	72.0%	99.7	8月31日渗漏故障检修	
99	回流泵8#	31	24	744	206		27.7%	100		
100	回流泵9#	31	24	744	96		12.9%	100		
101	回流泵10#	31	24	744	648		87.1%	100		
102	吸泥机5#	31	24	744	744		100.0%	100		
103	吸泥机6#	31	24	744	744		100.0%	100		
104	剩余污泥泵1#	31	24	744	0		0.0%	100		
105	剩余污泥泵2#	31	24	744	192.5		25.9%	100		
106	浓缩机4#	31	24	744	744		100.0%	100		
107	排泥泵1#	31	24	744	50.5		6.8%	100		
三期										
108	刮泥机4#	31	24	744	0		0.0%	100		
109	水下推流器13#	31	24	744	744		100.0%	100		

审核： 制表： 制表时间：2021-9-3

常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五）
2021年8月

编号	设备名称	运行天数（d）	定时（h/d）	额定运行时间（h）	实际运行时间（h）	故障（h）	利用率（%）	完好率（%）	检修保养情况	备 注
110	水下推流器14#	31	24	744	0		0.0%	100		
111	水下推流器15#	31	24	744	0		0.0%	100		
112	水下推流器16#	31	24	744	744		100.0%	100		
113	水下推流器17#	31	24	744	0		0.0%	100		
114	水下推流器18#	31	24	744	0		0.0%	100		
115	吸泥机7#	31	24	744	744		100.0%	100		
116	吸泥机8#	31	24	744	744		100.0%	100		
117	回流泵11#	31	24	744	0		0.0%	100	8月5日维护保养	
118	回流泵12#	31	24	744	744		100.0%	100	8月5日维护保养	
119	回流泵13#	31	24	744	744		100.0%	100	8月5日维护保养	
120	回流泵14#	31	24	744	0		0.0%	100	8月5日维护保养	
121	剩余污泥泵3#	31	24	744	0		0.0%	100		
122	剩余污泥泵4#	31	24	744	295.5		39.7%	100		
123	排泥泵2#	31	24	744	44		5.9%	100		
124	浓缩机5#	31	24	744	744		100.0%	100		
其它										
125	新粗格栅1#	31	24	744	0		0.0%	100		
126	新粗格栅2#	31	24	744	0	4	0.0%	99.5	8月16日更换链条	
127	新粗格栅3#	31	24	744	124		16.7%	100		
128	新粗格栅4#	31	24	744	124		16.7%	100		
129	粗格栅1#	31	24	744	124		16.7%	100		
130	粗格栅2#	31	24	744	124		16.7%	100		
131	细格栅1#	31	24	744	154	6	20.7%	99.2	8月10主轴开裂检修	
132	细格栅2#	31	24	744	238		32.0%	99	8月20日主轴梅花轮更换	
133	细格栅3#	31	24	744	248		33.3%	100		
134	细格栅4#	31	24	744	193	6	25.9%	99.2	8月4日主轴断裂，更换梅花轮	
135	老潜水泵1#	31	24	744	0		0.0%	100		
136	老潜水泵2#	31	24	744	0		0.0%	100		

审核： 制表： 制表时间：2021-9-3

常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六）
2021年8月

编号	设备名称	运行天数（d）	定时（h/d）	额定运行时间（h）	实际运行时间（h）	故障（h）	利用率（%）	完好率（%）	检修保养情况	备 注
137	老潜水泵3#	31	24	744	0		0.0%	100		
138	老潜水泵4#	31	24	744	0		0.0%	100		
139	老潜水泵5#	31	24	744	0		0.0%	100		
140	新潜水泵1#	31	24	744	722		97.0%	100		
141	新潜水泵2#	31	24	744	164		22.0%	100		
142	新潜水泵3#	31	24	744	594		79.8%	100		
143	新潜水泵4#	31	24	744	257		34.5%	100		
144	新潜水泵5#	31	24	744	744		100.0%	100		
145	新潜水泵6#	31	24	744	0		0.0%	100		
146	吸砂机1#	31	24	744	31	1	4.2%	99.9	8月4日吸砂泵检修	
147	吸砂机2#	31	24	744	31		4.2%	100		
148	鼓风机1#	31	24	744	0		0.0%	100		
149	鼓风机2#	31	24	744	0		0.0%	100		
150	鼓风机3#	31	24	744	0		0.0%	100		
151	鼓风机4#	31	24	744	0		0.0%	100		
152	鼓风机5#	31	24	744	0		0.0%	100		
153	鼓风机6#	31	24	744	0		0.0%	100		
154	鼓风机7#	31	24	744	0		0.0%	100		
155	鼓风机8#	31	24	744	0		0.0%	100		
156	鼓风机9#	31	24	744	0		0.0%	100		
157	鼓风机10#	31	24	744	0		0.0%	100		
158	新鼓风机1#	31	24	744	0		0.0%	100		
159	新鼓风机2#	31	24	744	0		0.0%	100		
160	新鼓风机3#	31	24	744	305		41.0%	100		
161	新鼓风机4#	31	24	744	247		33.2%	100		
162	新鼓风机5#	31	24	744	689	1	92.6%	99.9	8月20日更换滤网	
163	新鼓风机8#	31	24	744	607		81.6%	100		
164	离心脱水机1#	31	24	744	0		0.0%	100		
165	离心脱水机2#	31	24	744	23	4	3.1%	99.5	8月6日主机保养，轴承加油	
166	离心脱水机3#	31	24	744	479.5	6	64.4%	99.2	8月12日更换进泥泵定转子	

审核： 制表： 制表时间：2021-9-3

常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七）
2021年8月

编号	设备名称	运行天数（d）	定时（h/d）	额定运行时间（h）	实际运行时间（h）	故障（h）	利用率（%）	完好率（%）	检修保养情况	备 注
深度处理										
167	混凝搅拌器1#	31	24	744	0		0.0%	100		
168	混凝搅拌器2#	31	24	744	0	1	0.0%	99.9	8月23日更换变频器	
169	混凝搅拌器3#	31	24	744	0		0.0%	100		
170	混凝搅拌器4#	31	24	744	0		0.0%	100		
171	絮凝搅拌器1#	31	24	744	700		94.1%	100		
172	絮凝搅拌器2#	31	24	744	700		94.1%	100		
173	絮凝搅拌器3#	31	24	744	700		94.1%	100		
174	絮凝搅拌器4#	31	24	744	700		94.1%	100		
175	絮凝搅拌器5#	31	24	744	700		94.1%	100		
176	絮凝搅拌器6#	31	24	744	700		94.1%	100		
177	絮凝搅拌器7#	31	24	744	700		94.1%	100		
178	絮凝搅拌器8#	31	24	744	700		94.1%	100		
179	刮泥机1#	31	24	744	744		100.0%	100		
180	刮泥机2#	31	24	744	744		100.0%	100		
181	刮泥机3#	31	24	744	744		100.0%	100		
182	刮泥机4#	31	24	744	744		100.0%	100		
183	污泥回流泵1#	31	24	744	0		0.0%	100		
184	污泥回流泵2#	31	24	744	0		0.0%	100		
185	污泥回流泵3#	31	24	744	0		0.0%	100		
186	污泥回流泵4#	31	24	744	0		0.0%	100		
187	剩余污泥泵1#	31	24	744	0		0.0%	100		
188	剩余污泥泵2#	31	24	744	0		0.0%	100		
189	剩余污泥泵3#	31	24	744	0		0.0%	100		
190	剩余污泥泵4#	31	24	744	0		0.0%	100		
191	剩余污泥泵5#	31	24	744	0		0.0%	100		
192	剩余污泥泵6#	31	24	744	0		0.0%	100		
193	二氧化氯发生器1#	31	24	744	578.5		77.8%	100	8月6日主机、电柜维护保养	
194	二氧化氯发生器2#	31	24	744	483.5		65.0%	100	8月6日主机、电柜维护保养	
195	二氧化氯发生器3#	31	24	744	0		0.0%	100	8月6日主机、电柜维护保养	
196	二氧化氯发生器4#	31	24	744	695		93.4%	100	8月6日主机、电柜维护保养	
197	二氧化氯发生器5#	31	24	744	0		0.0%	100	8月6日主机、电柜维护保养	
198	二氧化氯发生器6#	31	24	744	328		44.1%	100	8月6日主机、电柜维护保养	

审核： 制表： 制表时间：2021-9-3

常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表

2021年8月

编号	仪表名称	规格型号	安装位置	运行情况	标定校准情况	备注
1	pH计	哈希PHD差分探头	一期细格栅井	正常	标定	（2、9、16、23）日
2	pH计	哈希PHD差分探头	出水口	正常	标定	（3、10、17、24）日
3	MLSS测量仪	哈希SC200-solitax	一期缺好氧池	正常	标定	（4、11、18、25）日
4	溶解氧检测仪	哈希SC200-LDO	一期缺好氧池	正常	标定	（3、10、17、24）日
5	溶解氧检测仪	哈希SC200-LDO	一期好氧池	正常	标定	（4、11、18、25）日
6	MLSS测量仪	哈希SC200-solitax	一期好氧池	正常	标定	（5、12、19、26）日
7	溶解氧检测仪	哈希SC200-LDO	二期好氧池	正常	标定	（2、9、16、23）日
8	MLSS测量仪	哈希SC200-solitax	二期好氧池	正常	标定	（3、10、17、24）日
9	溶解氧检测仪	哈希SC200-LDO	三期好氧池	正常	标定	（4、11、18、25）日
10	MLSS测量仪	哈希SC200-solitax	三期好氧池	正常	标定	（5、12、19、26）日
11	COD在线检测仪	JHC-IIIA	总排放口	正常	标定	16日
12	TP在线检测仪	JHP	总排放口	正常	标定	16日
13	NH3-N在线检测仪	JHN	总排放口	正常	标定	16日
14	TN在线检测仪	LYTN	总排放口	正常	标定	16日
15	COD在线检测仪	JHC-IIIA	进水口	正常	标定	28日
16	TP在线检测仪	JHP	进水口	正常	标定	28日
17	TN在线检测仪	LYTN	进水口	正常	标定	28日
18	NH3-N在线检测仪	JHN	进水口	正常	标定	28日
19	ORP在线仪表	PC-3100	一期厌缺氧池	正常	标定	（2、9、16、23）日
20	ORP在线仪表	PC-3100	二三期厌缺氧池	正常	标定	（3、10、17、24）日

审核：　　　　制表：　　　　制表日期：2021-9-3
